BUSINESS PLAN

Incubation des entreprises vertes – Paysage Bas Mangoky (PBM)

District de Morombe – Communes d'Ambahikily et Antongo Vaovao

---

Projet TEFIALA GEF-7 (FAO) – Appel à propositions RFP/2026/ULA/098

Lot 2 – Offre technique CARSO (réf. OFFRE-TECH-L2)

Durée du programme : 10 mois maximum

Sommaire

1. Résumé exécutif
2. Contexte et compréhension du besoin
3. Objectifs et résultats attendus 2
4. Modèle opérationnel : méthodologie d'incubation 4
5. Organisation et équipe 6
6. Moyens et logistique 8
7. Modèle économique et budget 8
8. Suivi, évaluation et gestion des risques 9
9. Perspectives de durabilité 10

Ce business plan présente le modèle économique et opérationnel du programme d'incubation que le CARSO propose de déployer pour transformer 8 organisations de producteurs (OP) des communes d'Ambahikily et Antongo Vaovao en entreprises vertes viables, dans les chaînes de valeurs prioritaires du paysage Bas Mangoky.

1. Résumé exécutif

Le CARSO (Centre d'Affaires de la Région Sud-Ouest, GIE basé à la CCI de Toliara) propose un programme d'incubation de 10 mois destiné à 16 entrepreneurs verts issus de 8 organisations de producteurs des communes d'Ambahikily et Antongo Vaovao (district de Morombe, région Atsimo Andrefana). Le programme couvre la sensibilisation, la formation entrepreneuriale (bootcamps de 3 jours), le coaching-mentoring, l'appui à la commercialisation et la recherche de financement. Au moins 50 % des incubés seront des femmes et des jeunes. Environ 200 membres d'OP bénéficieront indirectement du programme.

8	16	200	10 mois
OP CIBLES	INCUBÉS RETENUS	BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS	DURÉE DU PROGRAMME

2. Contexte et compréhension du besoin

Le projet TEFIALA (Restauration des Paysages et des Forêts, approche paysage et bassin versant, 2023-2028) est mis en œuvre par la FAO avec le MEDD et le MINAE. Il vise à transformer des organisations de producteurs, coopératives, groupes d'utilisateurs de forêts et mangroves et COBA en entreprises vertes à travers des programmes d'incubation. La FAO sollicite des Structures d'Appui à l'Entrepreneuriat (SAE) qualifiées, localisées dans les régions d'intervention, pour conduire ces programmes sous la supervision du Coordonnateur de projet RPF et Biodiversité de la FAO, en collaboration avec l'UGP TEFIALA.

Pour le Lot 2, les chaînes de valeurs prioritaires concernées par les communes d'Ambahikily et Antongo Vaovao sont : bois et énergie (charbon écologique, jeunes plants), riz (riz étuvé, riz blanc de qualité), légumineuses (grains secs triés et calibrés), fruits (frais, secs, confits, confitures, sirops), produits halieutiques (poissons frais, séchés, fumés), tubercules (cossettes et farine de patate douce) et vannerie (articles décoratifs, paniers, nattes en fibre végétale).

3. Objectifs et résultats attendus

3.1 Objectif global

Transformer les organisations de producteurs ciblées en entreprises vertes viables dans les chaînes de valeurs prioritaires du paysage Bas Mangoky, avec au moins 50 % de femmes et de jeunes parmi les incubés.

3.2 Résultats attendus (valeurs cibles Lot 2)

Indicateur	Cible Lot 2	Moyens de vérification
Programmes d'incubation mis en œuvre	1	Contrat d'incubation, planning d'incubation, rapport de démarrage (30 jours après signature)
Entrepreneurs verts identifiés et mobilisés	64	Liste des incubés, rapport de ciblage, fiches de présence (10 jours après session)
Proportion d'entrepreneurs mobilisés parmi les identifiés	50 %	Rapport de ciblage, fiches de présence
Entrepreneurs retenus pour le programme	32	Liste des incubés, fiches de présence
Bootcamps de gouvernance structurelle des OP	1	Organigrammes améliorés, rapports de formation
Bénéficiaires indirects du programme	400	Quantité de produits commercialisés, feedback clients
Taux d'applicabilité des acquis de l'incubation	85 %	Tests de connaissances, registres de coaching
Taux d'augmentation du chiffre d'affaires des incubés	80 %	Pièces justificatives commerciales

> Note : le tableau 5 des TDR indique 8 OP cibles, 16 incubés cibles et 200 membres d'OP indirectement bénéficiaires pour la commune d'Ambahikily (Lot 2) ; le tableau des indicateurs (tableau 10) fixe les cibles du Lot 2 à 64 identifiés, 32 retenus et 400 bénéficiaires indirects. Les deux références du document sont reportées telles quelles ; la ventilation définitive par commune sera confirmée avec la FAO et l'UGP au démarrage.

3.3 Lecture graphique des cibles

Le graphique suivant compare les cibles du Lot 2 à celles des autres lots du projet, telles qu'elles figurent au tableau 10 des TDR. Le Lot 2 porte les mêmes volumes que le Lot 1 (paysage Bas Mangoky), les lots 3 et 4 (Haute Matsiatra) portant des cibles plus élevées en nombre d'entrepreneurs.

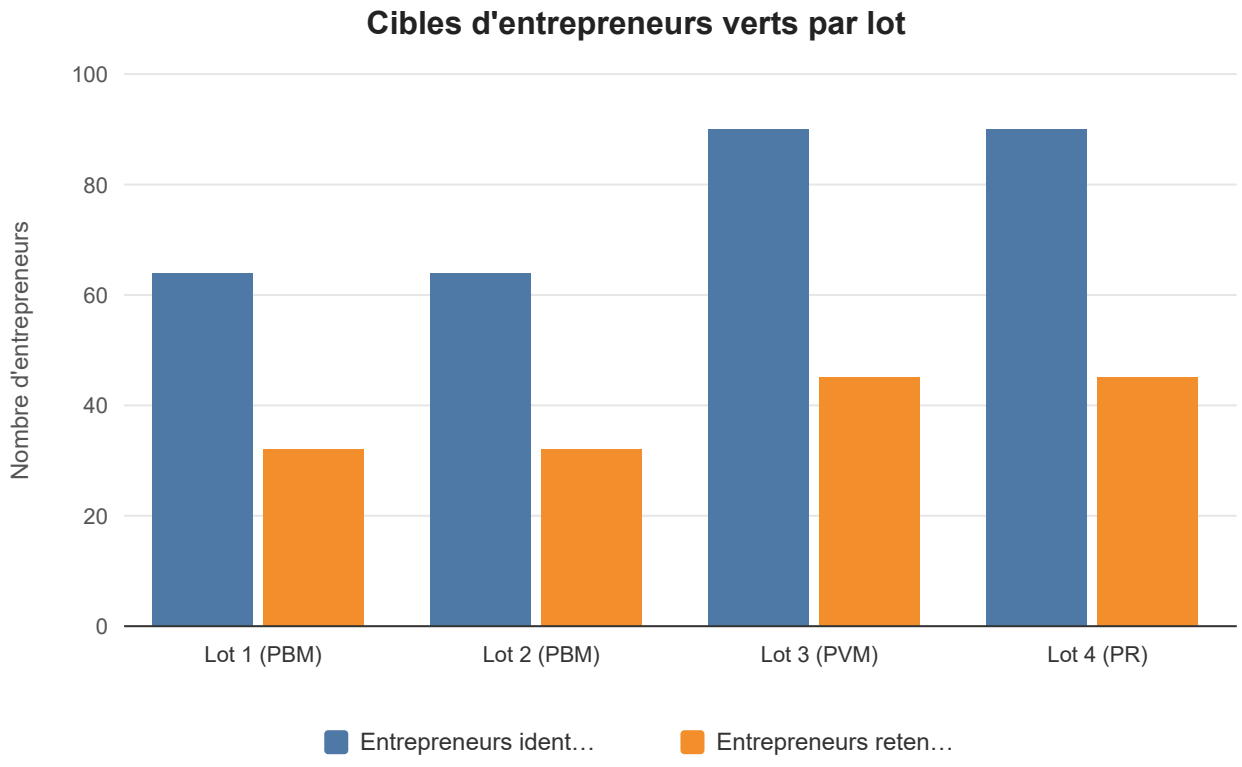


Figure 1 – Cibles d'entrepreneurs verts par lot (tableau 10 des TDR)

L'entonnoir de ciblage du Lot 2 se lit ainsi : 64 entrepreneurs verts identifiés et mobilisés, dont 32 retenus pour le programme (50 %), pour 16 incubés cibles par commune selon le tableau 5, avec un effet indirect sur 400 membres d'OP.

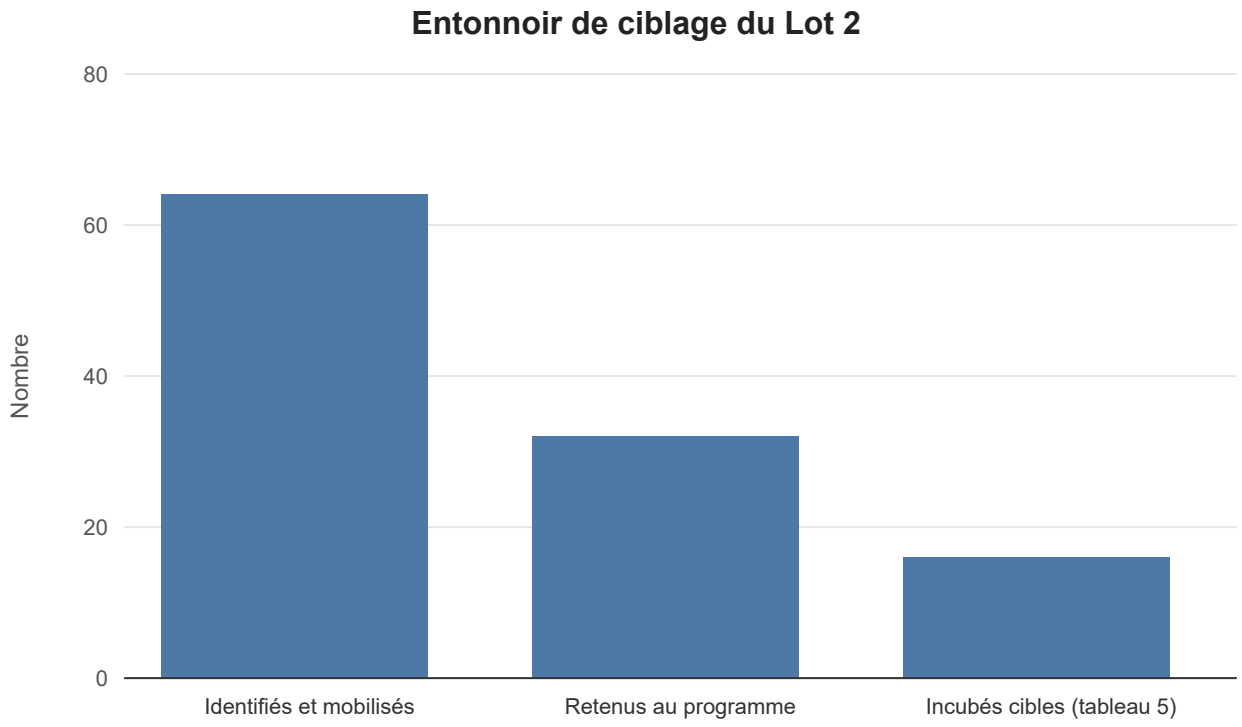


Figure 2 – Entonnoir de ciblage du Lot 2 (tableaux 5 et 10 des TDR)

4. Modèle opérationnel : méthodologie d'incubation

Le programme suit l'approche prescrite par les TDR : sensibilisation, formation entrepreneuriale, coaching-mentoring, appui à la commercialisation et à la recherche de financement, sur 10 mois maximum à compter de la signature du contrat.



Figure 3 – Frise des cinq phases du programme d'incubation (10 mois)

Phase	Période indicative	Activités principales	Livrable associé
1. Démarrage et ciblage	Mois 1	Affinage des critères d'éligibilité, identification et mobilisation des entrepreneurs verts, analyse de profil	Rapport initial (plan de travail, stratégie de mobilisation, calendrier) ; premier rapport d'étape (fin mois 1) avec listes de participants
2. Formation entrepreneuriale	Mois 2 à 6	Bootcamps de 3 jours (5 jours avec déplacements) : gouvernance structurelle des OP, plan d'affaires et gestion financière, comptabilité simplifiée, culture d'épargne, négociation avec les institutions financières ; 2 à 3 personnels des SAE présents à chaque session	Rapports de formation, fiches de présence, organigrammes améliorés
3. Coaching-mentoring	Mois 3 à 9	Suivi individuel des incubés, planification commerciale, mise en réseau avec mentors et acteurs de marché	Registres de coaching, plans d'affaires des incubés
4. Commercialisation et financement	Mois 7 à 10	Appui à la commercialisation, participation à des foires régionales et nationales, préparation à l'investissement, recherche de financement	Deuxième rapport d'étape (mois 7) : preuves des bootcamps et premiers résultats de planification commerciale
5. Clôture et post-incubation	Mois 10	Documentation des résultats, mentoring post-incubation facilité par la SAE, diffusion des bonnes pratiques entre pairs	Rapport final (mois 10) : mise en œuvre complète, mentorat, préparation à l'investissement, liens avec le marché, exemples de réussite

Les programmes d'incubation par lot se déroulent simultanément afin de disposer d'une cohorte d'entreprises vertes prêtes à affronter le marché d'ici fin août 2026.

4.1 Planning détaillé (diagramme de Gantt)

Le diagramme de Gantt ci-dessous détaille les activités du programme mois par mois, avec les jalons de reporting qui conditionnent les tranches de paiement. Il sera affiné avec la FAO dans le rapport initial (mois 1).

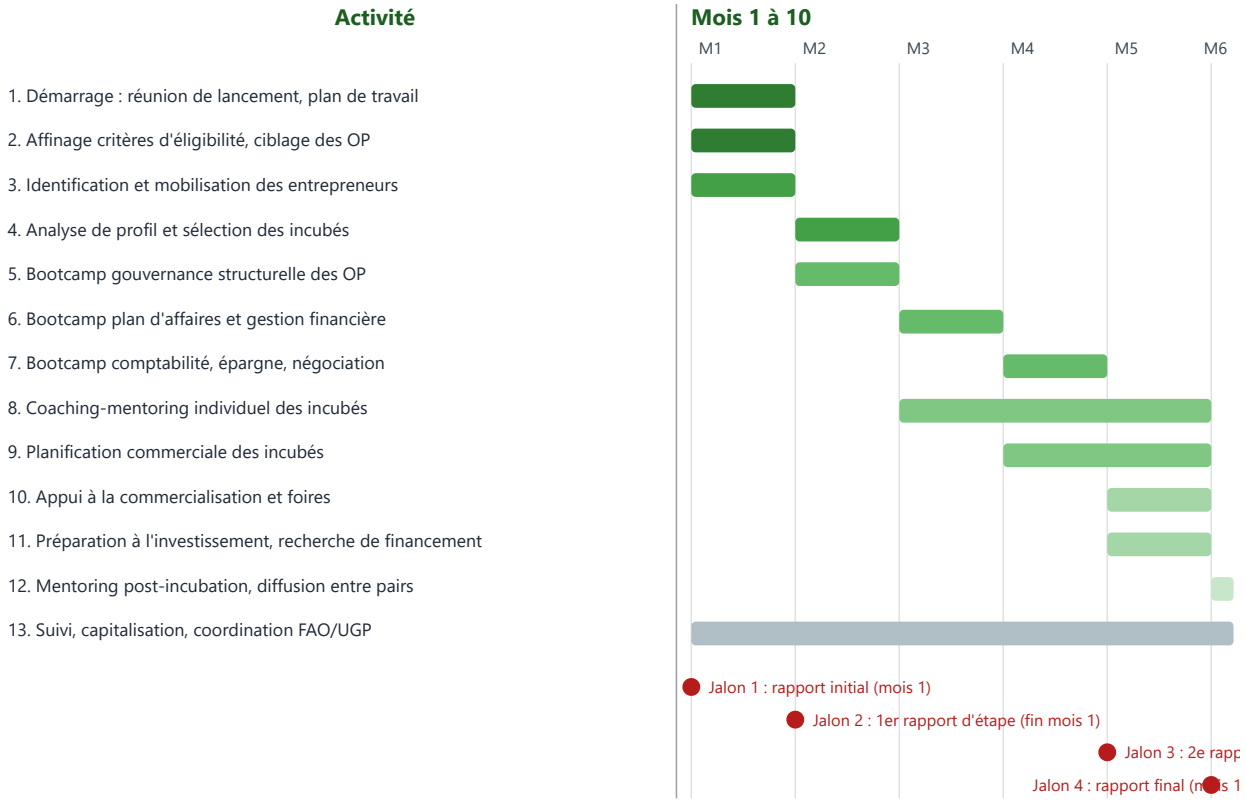


Figure 4 – Diagramme de Gantt du programme d'incubation Lot 2 (10 mois) avec les quatre jalons de reporting

5. Organisation et équipe

5.1 Organigramme du dispositif CARSO pour le Lot 2

Le dispositif CARSO s'articule autour d'un chef de mission, interlocuteur principal de la FAO et de l'UGP TEFIALA, appuyé par deux formateurs (40 HJ au total), des mentors spécialisés par chaîne de valeur et un appui logistique et administratif. Les noms des titulaires sont confirmés dans les CV jointes à l'offre technique.

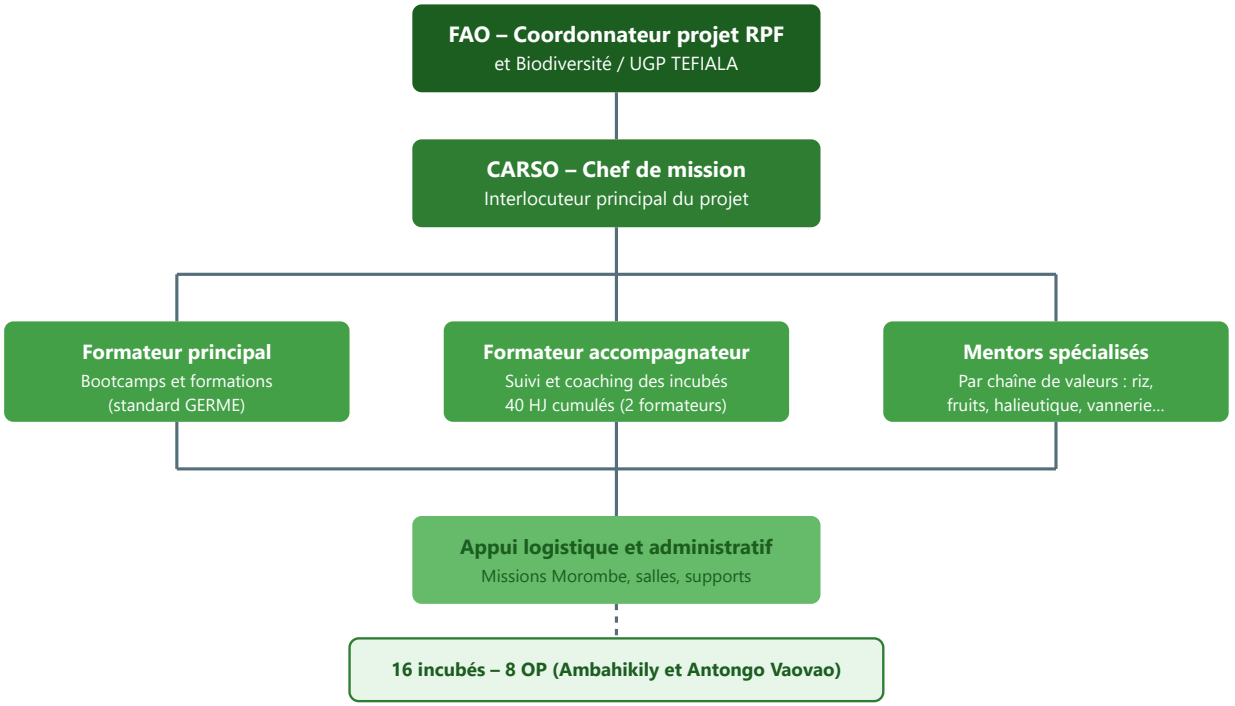


Figure 5 – Organigramme du dispositif CARSO pour le programme d'incubation Lot 2

5.2 Rôles et profils

Rôle	Missions principales	Charge indicative	Profil requis (TDR)
Chef de mission / coordonnateur	Interlocuteur principal du projet, suivi du programme dans son ensemble, management de l'équipe, suivi des incubés, participation aux réunions et missions de supervision	(à compléter)	Conformément au tableau 15 des TDR
Deux formateurs (principal et accompagnateur)	Conduite des formations selon le standard des programmes d'incubation, suivi et coaching des incubés	40 HJ	Bac+3 en agronomie, gestion, marketing, entrepreneuriat ou équivalent ; 3 ans d'expérience en formation
Mentors spécialisés	Accompagnement sectoriel des incubés (chaînes de valeurs du paysage)	(à compléter)	Réseau de formateurs et consultants expérimentés en incubation, mentors spécialisés secteur agricole, forestier et économie bleue

Le CARSO est expérimenté dans les programmes d'incubation selon le standard GERME (GERer au Mieux son Entreprise) et justifie d'expériences en incubation dans la région Atsimo Andrefana. Les CV détaillées et la ventilation complète des charges sont jointes à l'offre technique (à compléter).

6. Moyens et logistique

- Localisation : SAE localisée dans les régions d'intervention du projet (Atsimo Andrefana et Haute Matsiatra), exigence des TDR.
- Sites d'intervention : communes d'Ambahikily et Antongo Vaovao, district de Morombe, paysage Bas Mangoky.
- Salles de formation pour les bootcamps (3 jours par bootcamp, 5 jours avec déplacements).
- Supports de formation adaptés et modules capitalisés conformément au mandat (développement des modules de formation adaptés au programme d'incubation).
- Déplacements et logistique de terrain vers Morombe (à chiffrer dans l'offre financière).

7. Modèle économique et budget

Le contrat est un contrat à coûts remboursables : la FAO ne paie que les dépenses véritables et conformes au budget figurant à l'annexe B du protocole d'accord. Les paiements sont conditionnés par la remise des quatre rapports clés (rapport initial, premier et deuxième rapports d'étape, rapport final), chacun accompagné de pièces justificatives (listes de participants, supports de formation, photos, documents financiers, registres de coaching). À l'expiration du protocole, tous les fonds inutilisés sont restitués à la FAO.

Rubrique de coût	Description	Unité	Coût unitaire (Ar)	Quantité	Total (Ar)
Honoraires chef de mission	Pilotage, coordination, supervision	HJ	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)
Honoraires formateurs	Bootcamps et coaching des incubés	HJ	(à compléter)	40	(à compléter)
Mentors spécialisés	Accompagnement sectoriel	HJ	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)
Missions et déplacements	Toliara-Morombe, Ambahikily, Antongo Vaovao	forfait	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)
Salles et logistique de formation	Bootcamps de 3 jours	session	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)
Supports et modules de formation	Conception et reproduction	forfait	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)
Foires et mise en réseau commerciale	Participation des incubés (régional, national)	forfait	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)

Rubrique de coût	Description	Unité	Coût unitaire (Ar)	Quantité	Total (Ar)
Frais de fonctionnement et reporting	Rapports, suivi, coordination FAO/UGP	forfait	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)

> Aucun montant n'est fixé dans ce business plan : le budget détaillé (description, unité, coût unitaire, quantité, total par rubrique) sera établi selon le modèle de l'Appendice B des TDR et présenté dans l'offre financière, sur la base du plan de travail.

8. Suivi, évaluation et gestion des risques

8.1 Dispositif de suivi

- Suivi de la conformité des appuis avec les orientations stratégiques du projet (UGP TEFIALA).
- Suivi de l'avancement global : respect des calendriers, des livrables et des indicateurs de performance.
- Collecte, consolidation et analyse des données issues des rapports et des missions de supervision.
- Chaque rapport retourné après revue de la FAO est accompagné d'un fichier de suivi des modifications et recommandations.
- Calendrier de reporting : rapport de démarrage 30 jours après signature ; rapports de ciblage 10 jours après chaque mission ou session ; reporting mensuel, bimestriel et trimestriel selon les tableaux de suivi des TDR.

Deux indicateurs de résultat mesurent la performance du programme : le taux d'applicabilité des acquis (cible 85 %) et le taux d'augmentation du chiffre d'affaires des incubés (cible 80 %).

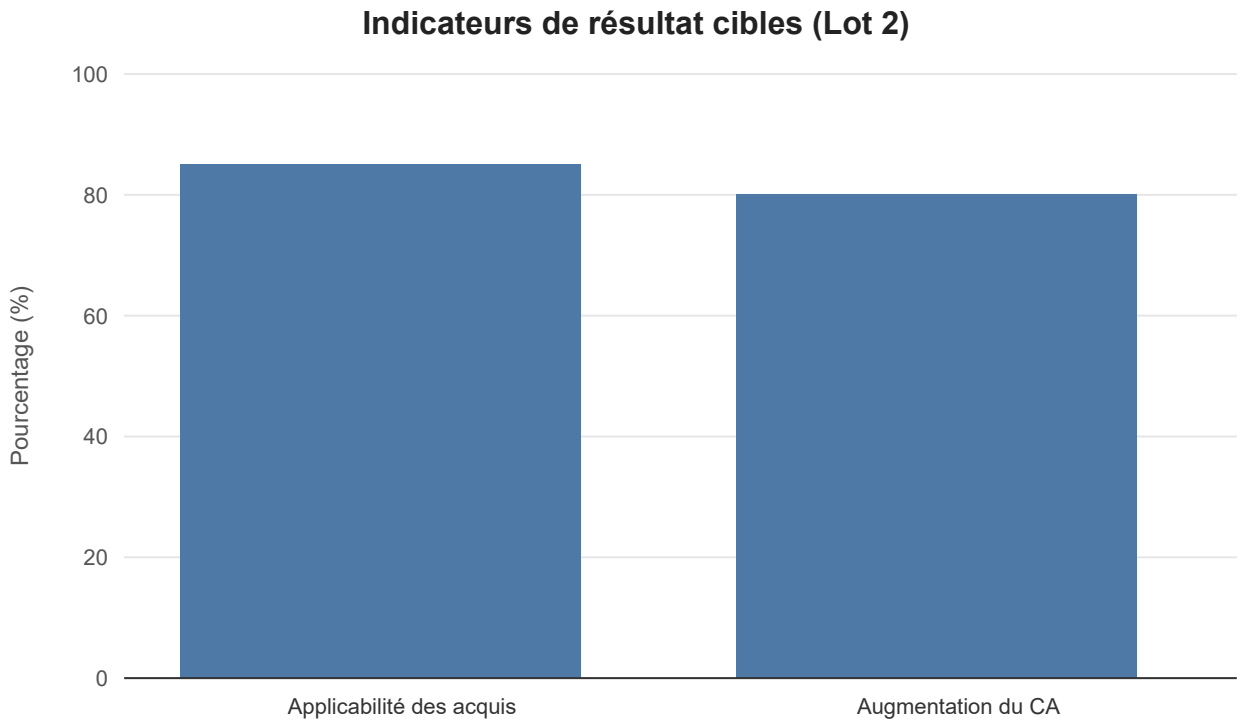


Figure 6 – Indicateurs de résultat cibles du Lot 2 (tableau 13 des TDR)

8.2 Risques et mesures prévues

Risque	Impact potentiel	Mesure prévue
Mobilisation insuffisante des entrepreneurs verts (cible : 50 % des identifiés)	Cohorte incomplète	Sensibilisation renforcée avec les autorités communales et les OP, affinage des critères d'éligibilité dès le mois 1
Enclavement et difficultés d'accès aux communes (Morombe)	Retards de sessions et de reporting	Planification des déplacements intégrée aux 5 jours par session ; calendrier validé avec la FAO
Accès limité au financement des incubés	Entreprises non viables après incubation	Module négociation avec les institutions financières, culture d'épargne, appui à la recherche de financement (mois 7-10)
Dépendance au financement projet (coûts remboursables)	Tension de trésorerie de la SAE	Phasage des tranches de paiement aligné sur les 4 rapports clés ; suivi financier rigoureux

9. Perspectives de durabilité

À l'issue du programme, les incubés poursuivent les sessions de mentoring sous la facilitation des structures d'appui à l'entrepreneuriat. Les liens fonctionnels entre OP, mentors, centres d'incubation et acteurs de marché, établis pendant l'incubation, restent opérationnels après la période du programme. Les compétences acquises par les membres incubés se diffusent aux 62 OP bénéficiaires indirects du

programme (dont les OP du paysage Bas Mangoky) et aux environ 1 550 membres d'OP touchés par le partage d'expériences entre pairs, le suivi-coaching post-incubation et la diffusion des bonnes pratiques entrepreneuriales.

La répartition des bénéficiaires indirects entre les paysages, telle que décrite dans les TDR, illustre le poids du paysage Bas Mangoky dans l'effet d'entraînement du programme : 800 membres d'OP pour le PBM contre 375 pour chacun des paysages de Haute Matsiatra.

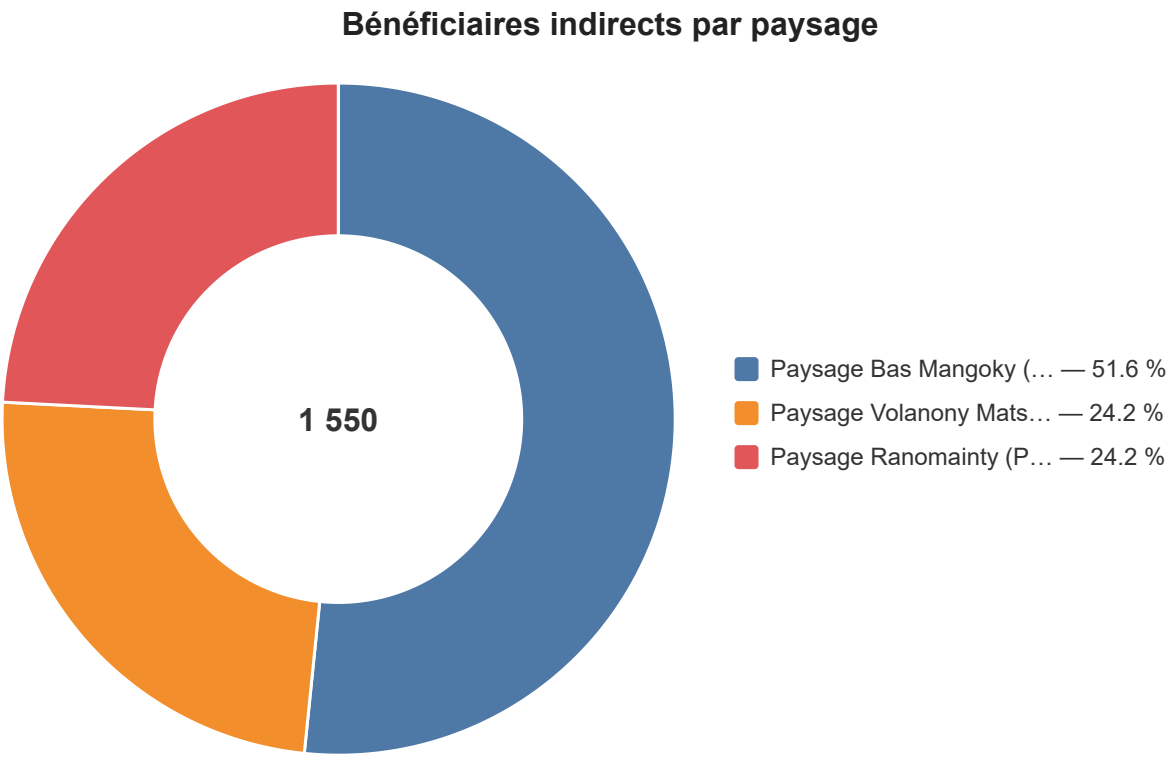


Figure 7 – Répartition des 1 550 membres d'OP bénéficiaires indirects par paysage (TDR)

CARSO Madagascar (GIE) – Centre d'Affaires de la Région Sud-Ouest

CCI Tsimenatsy, Toliara 1 – carso@carso.mg – +261 34 61 496 36
